GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

Dirección de Planificación y Desarrollo

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA FRONTERIZA (SNIP 14038)

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Octubre - Diciembre 2020

INFORME DE SEGUIMIENTO

A la fecha del 31 de diciembre del año 2020, el proyecto ha realizado dos (2) contrataciones para la ejecución del Hueco Starter y el Reto Emprendedor Frontera, a través de un proceso de licitación pública, que fue ganado por las empresas Protección Integral Empresarial S.R.L (PIE) y Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo ONG (ASAD).

Durante este trimestre los contratos de las empresas de PIE y ASAD fueron revisados por el MICM, a solicitud de la Contraloría General de la República, posterior al proceso de transición de las autoridades gubernamentales. Actualmente, los contratos están en proceso de ser descargados del Registro de la Contraloría General de la República, debido a que la vigencia de los mismos, ha terminado. Esto imposibilitó la gestión de desembolso de los pagos de consultorías para la ejecución física del proyecto.

Se creó un Petit-comité para dar seguimiento y llegar a acuerdos sobre los aspectos legales de los contratos, la actualización de estos en virtud de la Resolución No. IN-CGR-RES-2020-0012 de la prohibición de Reconocimiento de Deuda y Prolongación de Contratos en violación de Ley, que paralizó la continuidad de estos.

Se acordó con la entidad cooperante del proyecto, la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo (AECID), otorgar una ampliación del tiempo de ejecución del proyecto, por un plazo igual al tiempo que transcurrirá desde el 19 de marzo de 2020, fecha en que se decretó el estado de emergencia en República Dominicana, hasta la fecha en la que culmine el estado de emergencia.

A continuación se presenta la estructura del proyecto, entregables y metas:

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

Fortalecimiento de Capacidades en Emprendimiento Económico y Social para la Población Vulnerable de la Zona Fronteriza 4to Trimestre - 2020				
Componente	**Denominación del entregable**	**Unidad de medida**	**Meta**	**Nivel de avance físico acumulado al 4to. Trimestre de 2020**
Componente 1: Capacitación	Personas capacitadas en materia de emprendimiento para la creación y desarrollo de una idea de negocio	Personas capacitadas	1,215	0
Componente 2: Asistencia Técnica	Asistencia técnica para la implementación de planes de negocios	Asistencias técnicas	9	0
	Transferencia de capital semilla a los ganadores del Reto Frontera	Transferencias de capital semilla	9	0
Componente 3: Publicidad	Evento de difusión de casos de éxitos de nuevos emprendedores	Evento de difusión	1	0
Componente 4: Fortalecimiento institucional para la coordinación del proyecto	Actividades de dirección y coordinación del proyecto	Informes	24	16

Fuente: Unidad Ejecutora del Proyecto.

ANEXO AVIDENCIAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Ilustración 1. Reunión de Comité Técnico llevada a cabo el 11 de diciembre de 2020

Ilustración 2. Reunión de Comité Técnico llevada a cabo el 11 de diciembre de 2020

Ilustración 3. Reunión de Comité Técnico llevada a cabo el 11 de diciembre de 2020

Ilustración 4. Reunión de representantes de la Unidad Ejecutora del Proyecto, Dirección de Planificación y Desarrollo, ASAD, PIE y el MEPyD, realizada el día 17 de diciembre de 2020

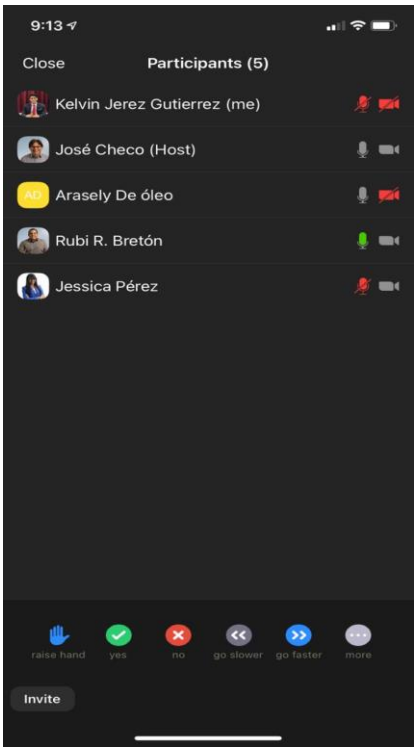

Ilustración 5. Reunión de representantes de la Unidad Ejecutora del Proyecto, Dirección de Planificación y Desarrollo, ASAD, PIE y MEPyD, realizada el día 17 de diciembre de 2020

Elaborado por:

Cástula Marrero
Encargada Departamento de Proyectos

Aprobado por:

Miguel I. Palmers
Director de Planificación y Desarrollo
